



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado:           **NUEVO LEÓN**          

Programa:           **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019**           Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:


No. de Obra:           **OP-MGNL-FTM-45/19-IR**                Nombre de la Obra:           **ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.**          

Localidad:           **EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL.**                Municipio:           **GARCÍA, N.L.**          

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato           **X**          .

Modalidad de Ejecución:	<u>          <b>INVITACIÓN RESTRINGIDA</b>          </u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>          <b>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-45/19-IR DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019</b>          </u>
Fecha de Adjudicación:	<u>          <b>31 DE MAYO DE 2019</b>          </u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>          <b>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-45/19-IR DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019</b>          </u>
Monto Original Contratado:	<u>          <b>\$          2,728,721.33</b>          </u>
Monto Total de Convenios:	<u>          <b>\$                  - 3.87</b>          </u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>          <b>\$          2'728,717.46</b>          </u>

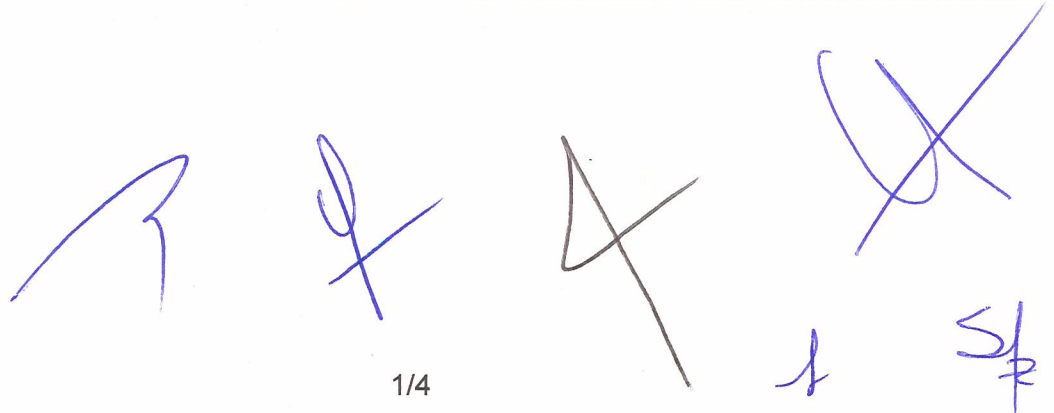



Contratista: ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/06/2019 Fecha de terminación: 02/08/2019  
Fecha real de inicio: 03/06/2019 Fecha real de terminación: 31/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:  
TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO ANTICORROSIVO, CÓNICO OCTAGONAL DE 9 MTS. DE ALTURA CAL 11 CON UN BRAZO ANTICORROSIVO DE 2" DE DIAM. X 2,4 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC 10" DE DIAM., CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2" DIAM., REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0, AWG 600 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA, MARCA VIAKON O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA DE 120-240 VOLTS EN 34000.

4.- Garantías:  
Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3677-02120-0 31 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$272,872.13  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3677-02119-4 31 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$818,616.40  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3677-02120-0 31 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$272,872.13  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA





5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,751,594.62	\$2,751,594.62	\$2,751,594.62		-
Inversión Ejercida	\$2'728,717.46	\$2'728,717.46	\$2'728,717.46		-
Saldo	\$22,877.16	\$22,877.16	\$22,877.16		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$818,616.40**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	03/06/19 AL 30/06/19	511,969.46	1'194,595.40
02 NORMAL	01/07/19 AL 15/07/19	168,673.63	393,571.81
03 NORMAL	16/07/19 AL 31/07/19	126,079.68	294,185.91
01 ADITIVA	01/07/19 AL 15/07/19	5,643.71	13,168.64
01 EXTRA	29/07/19 AL 31/07/19	6,249.92	14,579.30
<b>Sub-Total</b>		<b>\$818,616.40</b>	<b>\$1'910,101.06</b>
		<b>Total</b>	<b>\$2'728,717.46</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las **11:00** horas del día **30** de **AGOSTO DEL 2019.**

**Por la Dirección General de Obras Públicas**

---

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

---

**Ing. Marco Antonio Dímas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

**Por la Secretaría de Servicios Públicos**

---

**Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

---

**Nombre, firma y cargo**

**Por la Contraloría Municipal**

---

**Liliana Torres González**  
Nombre, firma y cargo  
Coordinadora Auditoría Desarrollo Urbano y Obra Pública

**"POR EL CONTRATISTA"**

---

**Eliud Josué Sáenz Garza**  
Representante Legal  
**ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA,**  
**S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-45/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**
