



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**COMUNICADO** (3) *fojes en copia simple*

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 ING. HERNÁN GABRIEL AGUIRRE ALVAREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

SEDUOP/DGOP/IMG/183/2021

*Flakeo 11-22*

20 ABR 2021

Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultrareciclamiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Marzo del año 2021




Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



*Atentamente*  
 ATENTAMENTE

N.L. A 15 DE ABRIL DEL 2021.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p Lic. María de Lourdes Williams Coutolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen\*



Blvd. Heberto Castillo #200  
 Colonia Paseo de las Minas,  
 García, Nuevo León, C.P. 66001  
 Teléfonos 81243900 y 81248800

*10:20 hrs*



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2021  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2021 AL 31/03/ DE 2021.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ABRIL	2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS									
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	GARCÍA	0%	0%		15.278.580,00		15.278.580,00																				
SUMA DE LA HOJA								15.278.580,00		15.278.580,00																				
SUBTOTAL								15.278.580,00		15.278.580,00																				
SUMA TOTAL								15.278.580,00		15.278.580,00																				

*[Handwritten Signature]*

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

  
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO

20 ABR 2021

POR: RODOLFO R  
 HORA: 12:47 hr

  
 Secretaría de Bienestar  
 20 ABR. 2021  
 Delegación Nuevo León






FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2021  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2021 AL 31/03/ DE 2021.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ABRIL	2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	399.345,43		399.345,43				395.263,95		395.263,95		m2	330,95			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANÍA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	279.100,14		279.100,14				276.885,92		276.885,92		ml	18,30			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	206.952,99		206.952,99				199.999,76		199.999,76		m2	358,19			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	120.913,61		120.913,61				118.237,88		118.237,88		pza.	3,00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	3%	30%	15/02/2021 AL 14/06/2021	3.542.363,52		3.542.363,52			1.057.396,07		1.057.396,07			ml	12.400,00			En Proceso.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEON.	100%	56%	08/02/2021 AL 09/03/2021	416.470,62		416.470,62				228.078,74		228.078,74		m2	680,00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR.	EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	60%	30%	22/03/2021 AL 20/05/2021	2.984.361,53		2.984.361,53			886.122,38		886.122,38			m2	1.459,98			En Proceso.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/21-IR	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA.	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL.PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	70%	30%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1.990.375,73		1.990.375,73			590.544,25		590.544,25			m2	1.885,00			En Proceso.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO.	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	1%	0%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1.046.985,27		1.046.985,27			0,00		0,00			m2	82,00			En Proceso.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA.	EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.	0%	0%	31/03/2021 AL 15/04/2021	161.315,01		161.315,01			0,00		0,00			pza.	1,00			Contratada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.	0%	0%	01/04/2021 AL 15/04/2021	128.824,81		128.824,81			0,00		0,00			m2	233,32			Contratada			
SUMA DE LA HOJA								11.277.008,66		11.277.008,66			3.752.528,96		3.752.528,96										
SUBTOTAL								11.277.008,66		11.277.008,66			3.752.528,96		3.752.528,96										
SUMA TOTAL								11.277.008,66		11.277.008,66			3.752.528,96		3.752.528,96										

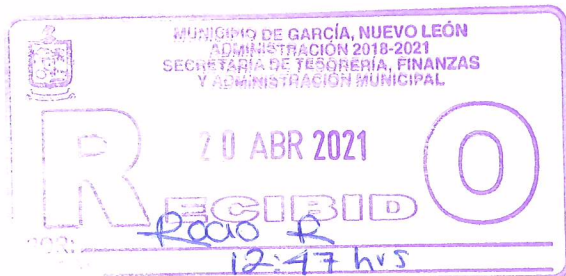

ARQ. CIRIANO TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2021  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2021 AL 31/03/ DE 2021.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ABRIL	2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS								
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		13.274.479,00		13.274.479,00																			
SUMA DE LA HOJA								13.274.479,00		13.274.479,00																			
SUBTOTAL								13.274.479,00		13.274.479,00																			
SUMA TOTAL								13.274.479,00		13.274.479,00																			

~~ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~

